

Plan de trabajo

Sistema Hotelero

Scrum + ClickUp + GitFlow + MySQL 8

DoR: planteamiento del sistema hotelero

DoD: main estable con datos poblados



Ambiente de base de datos

- Tablero funcional en ClickUp
- Historias y tareas con responsables
- DDL, DML, procedures, triggers y QA
- Ramas principales ya creadas

Ramas: main · dev · qa · feature/base-structure

¿Qué vamos a construir?

Hotel System Database Lab

Alcance técnico del laboratorio y resultado esperado



DDL Schema

Crear y validar la estructura de la base: tablas, llaves, relaciones, constraints e índices.



DML Reference Data

Cargar datos base: roles, permisos, estados, métodos de pago y catálogos iniciales.



DML Functional Data

Poblar datos de operación hotelera: clientes, reservas, estadías, facturas y pagos.



Data Integrity

Controlar reglas con procedures, triggers y checks para evitar datos huérfanos.

Resultado esperado

main


estable + poblado + validado

Sin registros huérfanos
Sin carga manual directa
Con evidencia de ejecución

Scrum aplicado al laboratorio

Hotel System Database Lab

Trabajamos por ciclos cortos, tareas visibles y entregables verificables

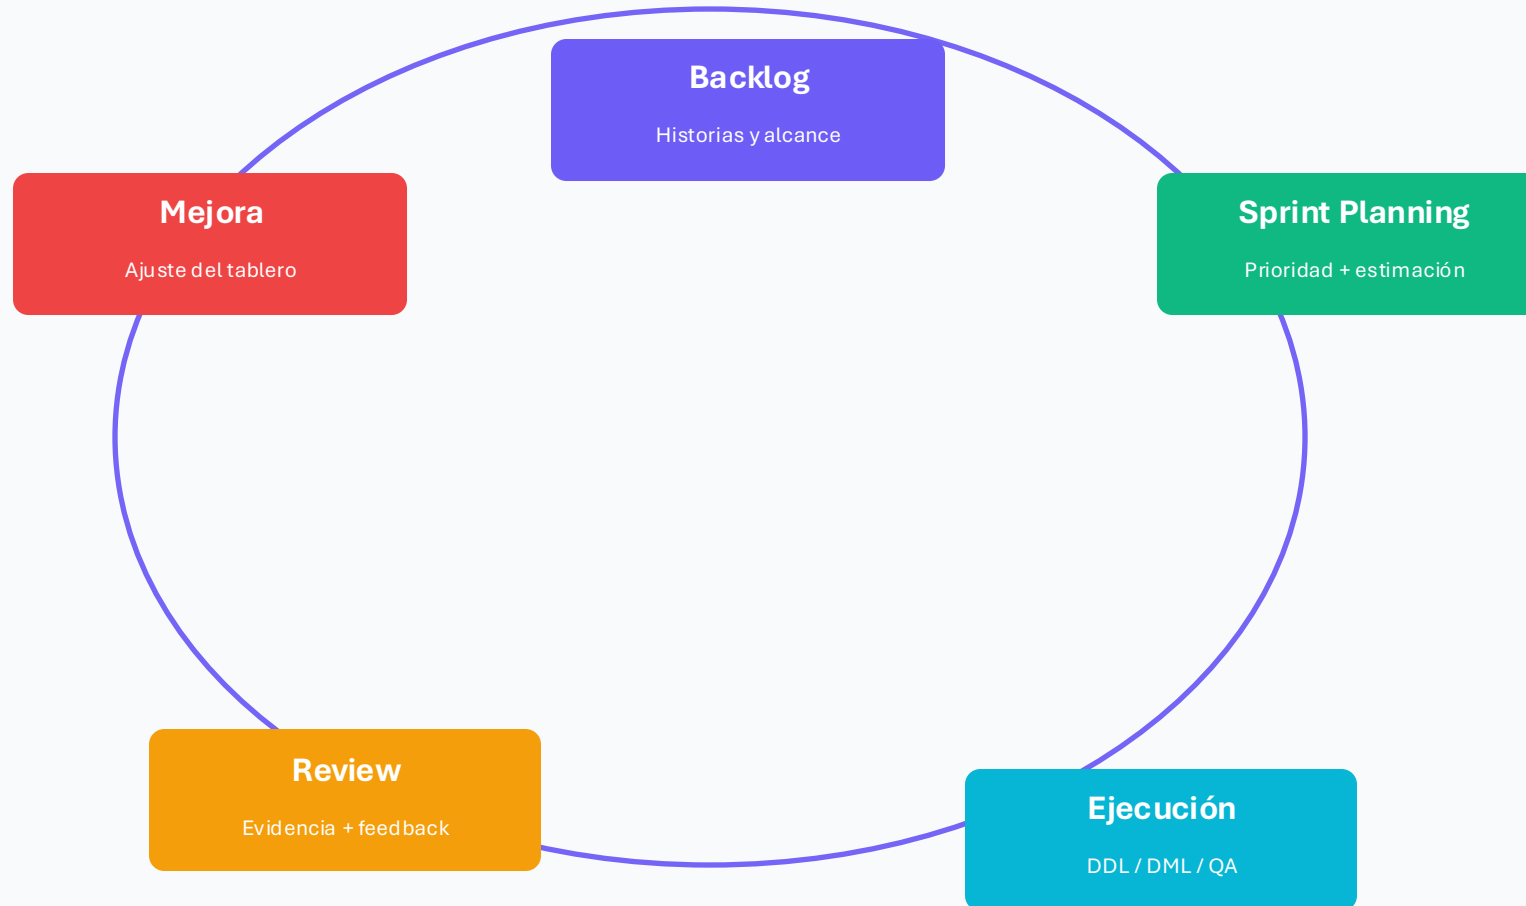

Scrum no es “hacer reuniones”: es controlar alcance, priorizar y cerrar tareas con evidencia.

Buenas prácticas para usar ClickUp

Hotel System Database Lab


Cómo evitamos desorden y hacemos visible el avance del equipo

- 1 Una tarea = una historia clara**
Nombre con HU, objetivo, criterios y evidencia esperada.
- 2 Estados simples y consistentes**
Pendiente → Ready → In Progress → Review → Testing → Done.
- 3 Responsable y fecha límite**
Cada tarea debe tener dueño, prioridad y estimación.
- 4 Evidencia antes de cerrar**
Capturas, logs, commits, PR o consulta de validación.
- 5 Agrupar por fase técnica**
Planning, DDL, DML, Procedures/Triggers, Security, QA y Docs.

Regla del tablero: si no tiene criterio de aceptación ni evidencia, no debe pasar a DONE.

GitFlow y ramas principales

El repositorio se controla por ambientes y cambios pequeños revisables

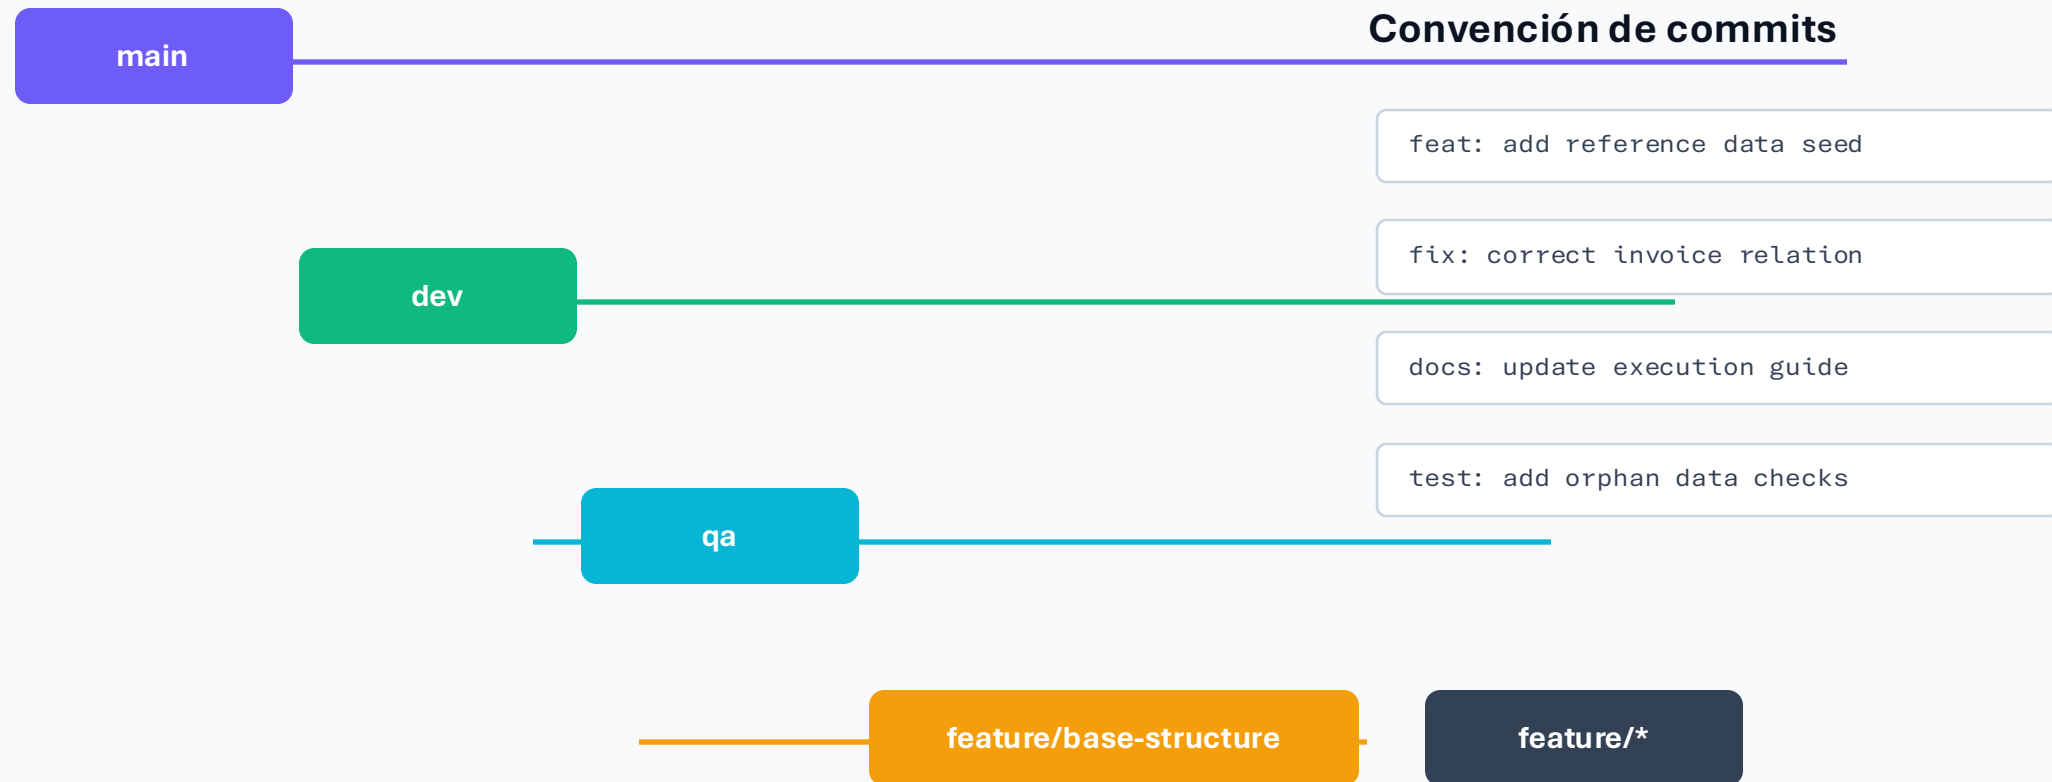

Buenas prácticas: código y commits en inglés, ramas por historia, PR antes de integrar y main protegido.

Ruta de entrega

Hotel System Database Lab

De tablero inicial a ambiente main estabilizado con datos poblados

1

Planning + backlog

2

Validar DDL

3

Cargar DML

4

Procedures + triggers

5

Seguridad + usuario

6

QA + evidencia final

Cierre esperado

Tablero actualizado · Scripts ejecutables · Datos consistentes · Permisos controlados · Evidencia adjunta

Mensaje clave: vamos a trabajar ordenados, medibles y con validación técnica, no solo con tareas sueltas.
